


KÖYDE 2005 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			GENEL TOPLAM
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	
OSMANİYE	BİTEN	10		10	21		21	31
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN							
	DEVAM EDEN							
	İHALE AŞAMASINDA OLAN							
	BAŞLAMAYAN							
	TOPLAM	10		10	21		21	31

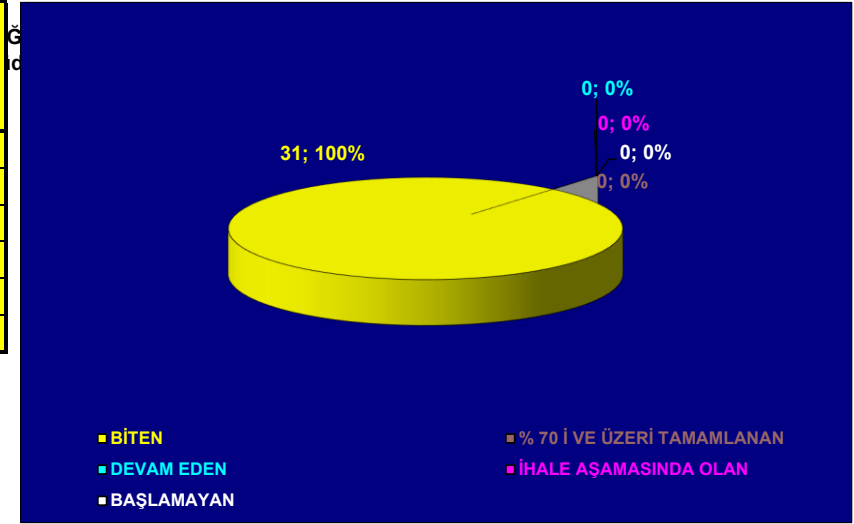

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN
OSMANİYE	HAM YOL (Km)		
	TESVİYE (Km)		
	STABİLİZE (Km)	45,00	45,00
	1.KAT ASFALT (Km)	3,00	3,00
	2. KAT ASFALT (Km)		
	BETON YOL (Km)		
	PARKE (m2)	0,00	2,84
	ONARIM (Km)	4,00	4,00
	TAŞ DUVAR (m3)		
	KÖPRÜ (Adet)	1,00	1,00
	MENFEZ (Adet)	160,00	160,00
	BÜZ (Adet)	278,00	278,00

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		FAYDALANACAK NÜFUS	TOPLAM ÜNİTE SAYISI	KÖY		BAĞLISI		FAYDALANACAK NÜFUS	TOPLAM ÜNİTE SAYISI
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)				
OSMANİYE	YENİ TESİS	0	18	4	63	12.073	85		18	4	63	12.073	85
	TESİS GELİŞTİRME		2		4	2.917	6		2		4	2.917	6
	BAKIM ONARIM												
	TOPLAM	0	20	4	67	14.990	91		20	4	67	14.990	91

Zübeyir KEMELEK
Vali

KÖYDES 2006 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU


İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			KANALİZASYON			SULAMA			GENEL TOPLAM
	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	
BİTEN	31	10	41	114	20	134	1	2	3	1	1	2	180
% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN													
DEVAM EDEN													
İHALE AŞAMASINDA OLAN													
BAŞLAMAYAN													
TOPLAM	31	10	41	114	20	134	1	2	3	1	1	2	180

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN
HAM YOL (Km)		
TESVİYE (Km)		
STABİLİZE (Km)	107,60	124,40
1.KAT ASFALT (Km)	73,30	75,20
2. KAT ASFALT (Km)	92,00	88,00
BETON YOL (Km)		
PARKE (m2)	40.000,00	104.000,0
ONARIM (Km)	1,00	1,23
TAŞ DUVAR (m3)		
KÖPRÜ (Adet)	1,00	5,00
MENFEZ (Adet)	416,00	416,00
BÜZ (Adet)		

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
	KÖY		BAĞLISI		FAYDALANACAK NÜFUS	TOPLAM ÜNİTE SAYISI	KÖY		BAĞLISI		FAYDALANACAK NÜFUS	TOPLAM ÜNİTE SAYISI
	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)		
YENİ TESİS	4	39	28	59	25.698	130	2	29	20	23	13.065	74
TESİS GELİŞTİRME		3	0	4	3.361	7		14		30	9.088	44
BAKIM ONARIM												
TOPLAM	4	42	28	63	29.059	137	2	43	20	53	22.153	118

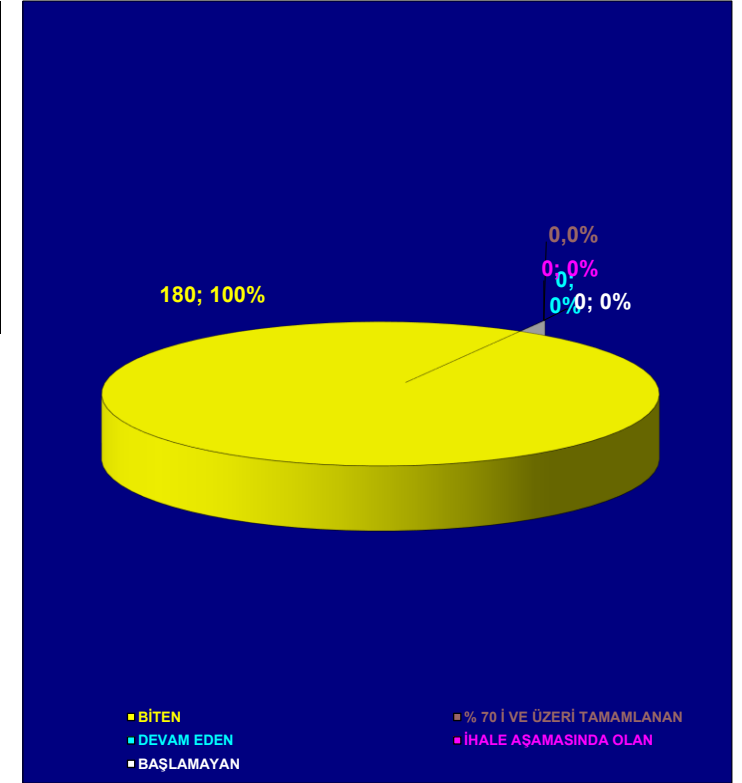

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

KÖYDES 2007 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU


	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			GENEL TOPLAM
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	
OSMANİYE	BİTEN	11	23	34	42	41	83	117
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN				0		0	0
	DEVAM EDEN				0		0	0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN				0		0	0
	BAŞLAMAYAN		0	0	0	0	0	0
	TOPLAM	11	23	34	42	41	83	117

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN
OSMANİYE	HAM YOL (Km)		
	TESVİYE (Km)	3,80	16,30
	STABİLİZE (Km)	38,50	71,70
	1.KAT ASFALT (Km)	35,20	36,05
	2. KAT ASFALT (Km)	17,70	12,00
	BETON YOL (Km)		1,80
	PARKE (m2)	121.400,00	100.531,00
	ONARIM (Km)	23,50	45,70
	TAŞ DUVAR (m3)		
	KÖPRÜ (Adet)		2,00
	MENFEZ (Adet)	112,00	613,00
	BÜZ (Adet)		413,00

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		FAYDALAN ACAK NÜFUS	TOPLAM	KÖY		BAĞLISI		FAYDALAN ACAK NÜFUS	TOPLAM
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)				
OSMANİYE	YENİ TESİS	6	12	40	23	14.467	81	6	14	40	25	15.885	85
	TESİS GELİŞTİRME			5	1	635	6		2	5	1	1.097	8
	BAKIM ONARIM								1			219	1
	TOPLAM	6	12	45	24	15.102	87	6	17	45	26	17.201	94

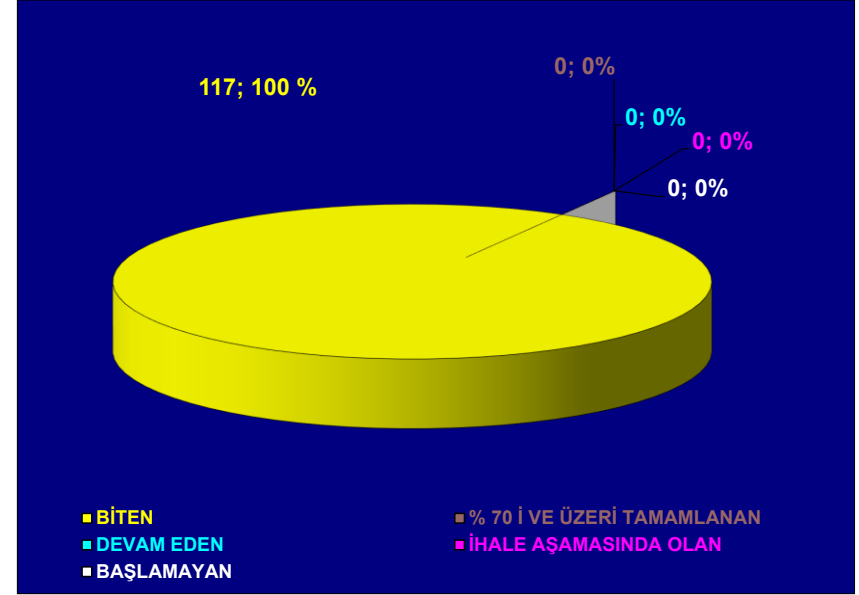


Zübeyir KEMELEK
Vali

KÖYDES 2008 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(05.05.2009 TARİHİ İTİBARIYLA)

	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			GENEL TOPLAM
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	
OSMANİYE	BİTEN	7	6	13	1		1	14
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN					1	1	1
	DEVAM EDEN							0
	İHALE AŞAMASINDA OLAN							0
	BAŞLAMAYAN							0
	TOPLAM	7	6	13	1	1	2	15

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN
OSMANİYE	HAM YOL (Km)		
	TESVİYE (Km)		
	STABİLİZE (Km)		
	1.KAT ASFALT (Km)	19,50	16,50
	2. KAT ASFALT (Km)		
	BETON YOL (Km)		
	PARKE (m2)		
	ONARIM (Km)		
	TAŞ DUVAR (m3)		
	KÖPRÜ (Adet)		
	MENFEZ (Adet)		20,00
	BÜZ (Adet)		112,00

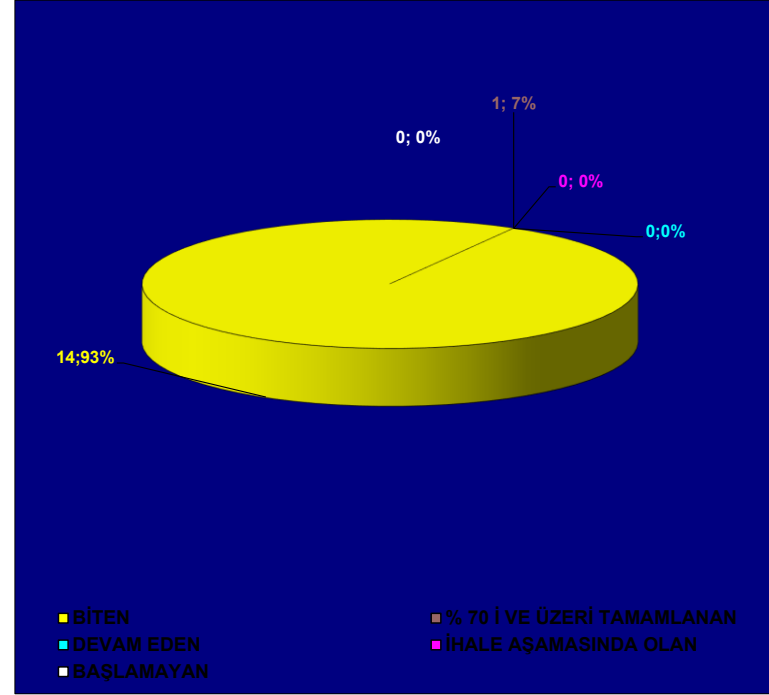

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		FAYDALAN ACAK NÜFUS	TOPLAM	KÖY		BAĞLISI		FAYDALAN ACAK NÜFUS	TOPLAM
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)				
OSMANİYE	YENİ TESİS												
	TESİS GELİŞTİRME	8	10	26	17	12.049	61	8	11	26	19	12.971	64
	BAKIM ONARIM												
	TOPLAM	8	10	26	17	12.049	61	8	11	26	19	12.971	64

TABLOYU HAZIRLAYANIN	
ADI SOYADI :	Ertuğrul KILIÇKIRAN
GÖREVİ:	Genel Sekreter
İŞ TELEFONU	0328 8141170
CEP TELEFONU	5.052.582.552,00
E-POSTA ADRESİ	e.kilickiran@gmail.com

Zübeyir KEMELEK
...../05/2009
Vali

**KÖYDES 2009 YILI KAPSAMINDA PLANLANAN İŞLERİN DURUMU
(08.01.2010 TARİHİ İTİBARIYLA)**

	İŞLERİN DURUMU	İÇME SUYU			YOL			GENEL TOPLAM
		SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	SENE BAŞINDA PLANLANAN	EK	TOPLAM	
OSMANİYE	BİTEN	15	4	19	2	1	3	22
	% 70 İ VE ÜZERİ TAMAMLANAN			0		2	2	2
	DEVAM EDEN	1		1	3		3	4
	İHALE AŞAMASINDA OLAN			0			0	0
	BAŞLAMAYAN	1		1			0	1
	TOPLAM		17	4	21	5	3	8

KÖY YOLLARI İŞLERİN DURUMU


	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN	BİTEN
OSMANİYE	HAM YOL (Km)	2,9	
	TESVİYE (Km)		
	STABİLİZE (Km)	5,0	
	1.KAT ASFALT (Km)	3,0	3,00
	2. KAT ASFALT (Km)	5,0	İPTAL
	BETON YOL (Km)		
	PARKE (m2)		
	ONARIM (Km)	20,0	8,50
	TAŞ DUVAR (m3)		
	KÖPRÜ (Adet)	1,0	1,00
	MENFEZ (Adet)	14,0	
	BÜZ (Adet)	14,0	

KÖY İÇME SULARI İŞLERİN DURUMU

	İŞLERİN NİTELİĞİ	SENE BAŞINDA PLANLANAN						BİTEN					
		KÖY		BAĞLISI		FAYDALAN ACAK NÜFUS	TOPLAM	KÖY		BAĞLISI		FAYDALAN ACAK NÜFUS	TOPLAM
		SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)	SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)			SUSUZ (Adet)	SUYU YETERSİZ (Adet)				
OSMANİYE	YENİ TESİS												
	TESİS GELİŞTİRME		5	5	11	26.443	21		5	7	7	25.273	19
	BAKIM ONARIM						0						
	TOPLAM	0	5	5	11	26.443	21	0	5	7	7	25.273	19

TABLOYU HAZIRLAYANIN

ADI SOYADI :	Hüseyin KARALAR
GÖREVİ:	Genel Sekreter V.
İŞ TELEFONU	0328 8141170
CEP TELEFONU	5056257772
E-POSTA ADRESİ	e.kilickiran@gmail.com

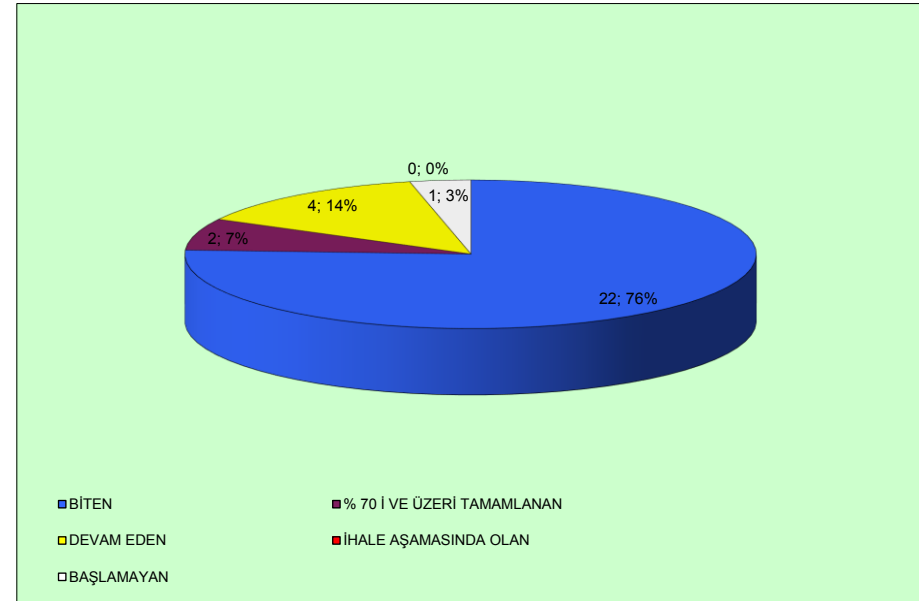

Celalettin CERRAH
...../01/2010
Vali

2005 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

Sayfa No:3

sıra no	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Ham Yol	Tesviye	Onarım	Stabilize	1.Kat Asf.	2.Kat Asf.	Beton Yol	Sanat Yapısı	Gerçekleştime Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU						
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Km	Km		Km	Km	Km	Km	Km	Adet	Fiziki	Maddi	Bitti	% 70 den Fazla	Dev.Ed.	İHL.Aşm.	Başlanmadı	Açıklamalar			
26.	Osmaniye	Düziçi	İçmesuları	Selverler Köyü	Merkez	382	1		60.000									100	136	1						Sondaj
27.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	Yoğunluk Köyü	Merkez-Dikenli-Kaş	1500		1	50.000									100	164	1						
28.	Osmaniye	Kadri	İçmesuları	Karapınar Grup İçmesuyu	Grup	9737	1		295.000																	İl Özel İdaresi ile işbirliği doğrultusunda ödenek il özel idaresine aktarılmıştır. İhalesi yıllara sari olarak İl Özel İdaresince yapılmıştır.
29.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Armağanlı Köyü	Ebiceler Mah.	300	1		90.000									100	82	1						
30.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Yazıboyu Köyü	Merkez	312	1		50.000									100	92	1						
31.	Osmaniye	T.kale	İçmesuları	B.Tüysüz Köyü	Merkez	914		1	20.000									15	15	1						

2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

Sayfa No:2

sıra no	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Ham Yol Km	Tesviye Km	Onarım Km	Stabilize Km	1.Kat Asf. Km	2.Kat Asf. Km	Beton Yol Km	Sanat Yapısı Adet	Gerçekleştime Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU																			
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Fiziki	Maddi										Bitti	% 70 den Fazla	Dev.Ed.	İHL.Aşm.	Başlanmadı	Açıklamalar																
17.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Gökmustafalı Köyü	Köyiçi	206			15.000				0,5				16	100	76	1																			
18.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Kızlaç Köyü	Yk.Mahalle	637			25.000					1,5				100	243	1																	Yol Genişletme Çalış. Bitti.19.07.2006 tarih ve 108 sayılı olur ile 1.kat asfalt yapıldı.		
19.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Aş. Karderesi köyü	Köyiçi	135			65.000									100	62	1																	Köprü inşaatı tamamlanmıştır.		
20.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Aş. Karderesi köyü	Köyiçi	135			20.000							0,5		100	202	1																	08.09.2006 tarih ve 132 sayılı olur ile kilit parke taşı yapılmıştır.		
21.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Savranlı Köyü	Köyiçi	112			9.000								27	100	36	1																			
22.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Savranlı Köyü	Köyiçi	112			10.890								1	100	35	1																		08.09.2006 tarih ve 132 sayılı olura istinaden yerinde menfez yapılmaktadır. Demir çimento alınmıştır.	
23.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Yk.Karderesi köyü	Köyiçi-Yeni Mahalle	187			25.000			0,5		1,0				100	167	1																			
24.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Yaylalık Köyü	Köyiçi	462			60.000				3,0					100	68	1																			
25.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	İnderesi Köyü	Köyiçi	290			15.000				0,75					100	99	1																			
26.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Arıklıkaş Köyü	Köyiçi	395			40.000							1,0		100	193	1																		08.09.2006 Tarihli Valilik Oluruna istinaden parke yol yapılmıştır.	
27.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Bekdemir Köyü	Bastambaklı	92			20.000					2,0				100	368	1																		08.09.2006 Tarihli Valilik Oluruna istinaden ek iş yapılmıştır.	
28.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Bekdemir Köyü	Dutlu-Çelikler-Mercanlar	542			90.000					2,0				100	100	1																		08.09.2006 Tarihli Valilik Oluruna istinaden ek iş yapılmıştır.	
29.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Aş.Arıcaklı Köyü	Köyiçi	395			34.000					0,75				100	129	1																		08.09.2006 Tarihli Valilik Oluruna istinaden ek iş yapılmıştır.	
30.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Nohut	Köyiçi	432			41.250							0,5		100	67	1																		08.09.2006 Tarihli Valilik Oluruna istinaden ek iş yapılmıştır.	
31.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Aş.Arıcaklı Köyü	Köyiçi	395												100	70	1																		08.09.2006 Tarihli Valilik Oluruna istinaden ek iş yapılmıştır.Köprü inşaatı devam etmektedir.	
32.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Yk.Arıcaklı Köyü	Köyiçi	279			20.000					1,5				100	277	1																		Stabilize yerine 19.07.2006 tarih ve 108 sayılı olur ile 1.kat asfalt yapıldı.	
33.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Örencik Köyü	Köyiçi	724			20.000					1,0				100	162	1																		Stabilize yerine 19.07.2006 tarih ve 108 sayılı olur ile 1.kat asfalt yapılmıştır.	

2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

Sayfa No:3

sıra no	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Ham Yol	Tesyive	Onarım	Stabilize	1.Kat Asf.	2.Kat Asf.	Beton Yol	Sanat Yapısı	Gerçekleştim e Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU										
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Km	Km										Km	Km	Km	Km	Adet	Fiziki	Maddi	Bitti	% 70 den Fazla	Dev.Ed.	İHL.Aşm.	Başlanmadı	Açıklamalar
34.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Ariklıkaş Köyü	taşoluk				29.914			0,18							100	91	1						19.04.2007Tarih ve 70 sayılı Valilik Oluruna istinaden ek iş yapılmıştır.			
35.	Osmaniye	Bahçe	Köyolları	Yk Karderesi	Gaziler				20.725			0,05							100	62	1						19.04.2007Tarih ve 70 sayılı Valilik Oluruna istinaden ek iş yapılmıştır.			
36.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Akdere Köyü	Akdere-Telliler	546			60.000				3,0						100	100	1									
37.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Pirsultanlı köyü	Köyiçi	381			100.000				5,0						100	100	1									
38.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Karaguz köyü	Karaguz	452			30.000				1,5						100	100	1									
39.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Selverler köyü	Selverler	382			48.000				2,0				14	100	100	1										
40.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Çotlu köyü	Çotlu	259			111.000				5,0				14	100	100	1										
41.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Akçakoyunlu Köyü	Akçakoyunlu	428			55.000				2,0				14	100	100	1							01.10.2006 tarih ve 1421 sayılı olur ile stabilize den parke taşına dönüştürüldü.			
42.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Düziçi Genel	Köyler				45.000									100	184	1										
43.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Çiftli Köyü	Çiftli	435			70.000				2,0		2,0		28	100	100	1							Stabilizeden 03.10.2006 tarih ve 1421 sayılı olur ile parke taşı döşenmesine dönüştürüldü.			
44.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Gümüş	Gümüş	880			43.000				2,0				7	100	25	1										
45.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Kuşçu köyü	Kuşçu	525			57.000				2,5				14	100	35	1										
46.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Olukluçunur Köyü	Grp.Kyy.İlt.O.Çunur-Çükgüller-K.Taş-K.Bucak	455			80.000				4,0					100		1										
47.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Çerçioğlu köyü	Çerçioğlu-Karakuyu	104			67.500					1,5				100		1										
48.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Gökçayır köyü	Köyiçi	236			90.000					2,0				100		1										
49.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Gümüş-Mezdağ	Gümüş-Mezdağ	880			200.000					4,5				100		1										
50.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Elbeyli-Hartlaplı	Elbeyli-Hartlaplı	302			67.500					1,5				100		1										
51.	Osmaniye	Düziçi	Köyolları	Hıdırlı-Karakuyu	Çerçioğlu	440			110.000					2,5				100		1										

2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

Sayfa No:6

sıra no	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Ham Yol	Tesviye	Onarım	Stabilize	1.Kat Asf.	2.Kat Asf.	Beton Yol	Sanat Yapısı	Gerçekleştim e Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU							
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Yeni Tesis	Tesis Geliştirme		Km	Km	Km	Km	Km	Km	Km	Adet	Fiziki	Maddi	Bitti	% 70 den Fazla	Dev.Ed.	İHL.Aşm.	Başlanmadı	Açıklamalar		
88.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Koçlu Köyü	Koçlu-Aknat-Taştepe	301			225.000					5,0				100	100	1							
89.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Karakütük köyü	Üçkazan-K.Kütük-Kokar	256			112.500					2,5				100	100	1							
90.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Anberinarkı köyü	Kümbet-Amberinarkı	1025			45.000					1,0				100	100	1							
91.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Söğütlüdere köyü	S.Dere-Karatopaklı	335			90.000					2,0				100	100	1							
92.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Öksüzlü-Erdoğdu köyü	Öksüzlü-Erdogdu	536			15.000						1,5			100	100	1							
93.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Kesikkeli-Mecidiye köyü	Kesikkeli-Mecidiye-Tozlu	838			30.000						3,0			100	100	1							
94.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Bahadırılı-Çobankayası köyü	Bahadırılı-Ç.Kahyalar-Bekereci-K.Taş-G.Ahmetli	400			30.000						3,0			100	100	1							
95.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Hardallık-Aydınlar	A.Fakılı-Göçmen-Sarılar	1041			30.000						3,0			100	100	1							
96.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Çukurköprü-Kiremitli	Çukurköprü-Kiremitli	905			20.000						2,0			100	100	1							
97.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Kümbet-H.Haliloğlu	Kümbet-Göçmen-H.Haliloğlu	1017			40.000						4,0			100	100	1							
98.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Çiğdemli-Mehedinli-Yk.Çıyanlı	Çivilı-Gözübüyük-Teslimeler	995			30.000						3,0			100	100	1							
99.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Yusufzettin köyü	Pampallı	699			10.000						1,0			100	100	1							
100.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Tekeli Köyü	Merkez	286			30.000				1,5					100	100	1							
101.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Kösepinarı köyü	Kösepinarı-Yoğunluk	100			100.000				5,0					100	100	1							
102.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Kesikkele köyü	Merkez	427			100.000							1,46		100	100	1							
103.	Osmaniye	Kadirli	Köyolları	Yoğunluk köyü	Merkez	668			125.000							1,0		100	100	1							Osmaniye valiliğinin 07.08.2006 tarih ve 2006 - 123 sayılı oluru doğrultusunda

2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

Sayfa No:9

Sıra no	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Ham Yol	Tesviye	Onarım	Stabilize	1.Kat Asf.	2.Kat Asf.	Beton Yol	Sanat Yapısı	Gerçekleştim e Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU						
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Km	Km		Km	Km	Km	Km	Adet	Fiziki	Maddi	Bitti	% 70 den Fazla	Dev.Ed.	İHL. Aşm.	Başlanmadı	Açıklamalar				
																							Yeni Tesis	Tesis Geliştirme		
135.	Osmaniye	Merkez	İçmesuları	Serinova Köyü	Merkez	479	1		300.000									100	75,1	1						Hizmete Açıldı
136.	Osmaniye	Merkez	İçmesuları	Alahanlı köyü	Merkez	673		1	100.000									100	100	1						İsale Hattı Yapılıyor
137.	Osmaniye	Merkez	İçmesuları	Şekerdere Köyü	Merkez	894		1	24.000									100	55,55	1						
138.	Osmaniye	Merkez	İçmesuları	Çağşak köyü	Merkez	532		1	66.000									100	100	1						İsale hattı yapılıyor.
139.	Osmaniye	Merkez	İçmesuları	Kesmeburun köyü	Merkez	611		1	70.000									100	55	1						
140.	Osmaniye	Merkez	İçmesuları	Küllü köyü	Merkez	118		1	20.000									100	72,86	1						
141.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Bekdemir İçmesuyu	Merkez	1299	1		400.000									100	62	1						
142.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Yk.Aricaklı Köyü	İbişler	76	1		60.000									100	44	1						
143.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Örencik Köyü	Merkez	242	1		90.000									100	51	1						
144.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Nohut köyü	Merkez	432		1	31.000									100	69	1						
145.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Yk.Aricaklı Köyü	Merkez	203		1	19.000									100	99	1						
146.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Yk.Karderesi köyü	Merkez	187		1	31.000									100	66	1						
147.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Burğaçlı köyü	Merkez	577		1	19.000									100	93	1						
148.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Arıklıkış Köyü	Merkez	395		1	19.000									100	91	1						
149.	Osmaniye	Bahçe	İçmesuları	Arıklıkış Köyü	Taşoluk			1	47.000									100	69	1						19.04.2007Tarih ve 70 sayılı Vâlilik Oluruna istinaden ek iş yapılmıştır.
150.	Osmaniye	Düziçi	İçmesuları	Bayındırlı-Gökçayır Grubu	9 Köy 28 Ünite	6884	1		500.000									100	100	1						
151.	Osmaniye	Düziçi	İçmesuları	Pirsultanlı-Gümüş	Pirsultanlı-Gümüş	1261	1		71.000									100	100	1						
152.	Osmaniye	Düziçi	İçmesuları	Bayındırlı-Gökçayır Grub	9 Köy 28 Ünite	6884	1		1.500.000									100	100	1						
153.	Osmaniye	Düziçi	İçmesuları	Çamiçi	Çamiçi	868	1		129.000									100	100	1						
154.	Osmaniye	H.Beyli	İçmesuları	Yanıkkişla	Yanıkkişla	212	1		89.000									100	98	1						

2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

Sayfa No:10

Sıra no	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Ham Yol	Tesviye	Onarım	Stabilize	1.Kat Asf.	2.Kat Asf.	Beton Yol	Sanat Yapısı	Gerçekleştim e Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU						
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Km	Km		Km	Km	Km	Km	Adet	Fiziki	Maddi	Bitiri	% 70 den Fazla	Dev.Ed.	İHL. Aşm.	Başlanmadı	Açıklamalar				
																							Yeni Tesis	Tesis Geliştirme		
155.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	Karapınar Grup İçmesuyu	15 Köy ve 63 Bağlısı	9737	1		1.000.000									100	100	1						1.etap harcamaları % 100 gerçekleşmiş olup,2.etap imalatları devam etmektedir.
156.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	Tahta Köyü	Tahta-Pürçek	90		1	40.000									100	100	1						
157.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	Tahta Köyü	Tahta-İncik	80		1	40.000									100	100	1						
158.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	Yoğunluk Ky.	Merkez	668	1		46.050									100	100	1						Osmaniye valiliğinin 07.08.2006 tarihli oluru doğrultusunda
159.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	Yoğunluk Ky.	Kastal	110	1		90.000									100	100	1						
160.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	İlbistanlı	Merkez	305	1		3.500									100	100	1						Osmaniye valiliğinin 11.09.2006 tarihli oluru doğrultusunda
161.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	Tahta	Merkez	376			4.855									100	100	1						Osmaniye valiliğinin 11.09.2006 tarihli oluru doğrultusunda
162.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	Karapınar Grup İçmesuyu	15 Köy ve 63 Bağlısı	9737	1		2.774.000									100	100	1						2. etap çalışmaları devam etmektedir.
163.	Osmaniye	Kadirli	İçmesuları	İlbistanlı	İlbistanlı -Bilalli	305	1		61.843									100	100	1						Osmaniye valiliğinin 15.11.2006 tarihli oluru doğrultusunda
164.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Çiçeklidere Köyü İçmesuyu Tesisi	Çiçeklidere	301	1		231.000									100	65	1						
165.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Höyük Köyü İç.Suyu Tesisi Şebeke,Kaptaj ve İsale Hattı	Höyük	168		1	55.000									100	61	1						
166.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Armağanlı-Halilibrahimli İçmesuyu Tesisi	Arağanlı-Halilibrahim	288	1		100.000									100	130	1						
167.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Gafarlı Mekez-Cemiller-Güveluşağı-Gökgedik Şebeke Yenilenmesi	Gafarlı	320		1	15.000									100	99,76	1						
168.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Akdam Merkez ve Işıklı Şebeke Yenilenmesi	Akdam	664		1	10.000									100	100	1						
169.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Köseli Gençaliler Şebeke Yenilenmesi	Köseli	672		1	15.000									100	61	1						

2006 YILI KÖYDES AYLIK İZLEME CETVELİ

Sayfa No:11

Sıra no	İLİ	İLÇESİ	SEKTÖRÜ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ		TUTARI	Ham Yol	Tesviye	Onarım	Stabilize	1.Kat Asf.	2.Kat Asf.	Beton Yol	Sanat Yapısı	Gerçekleştim e Yüzdesi		İŞLERİN DURUMU					
				ADI	YERİ (KÖY ÜNİTE)		Km	Km		Km	Km	Km	Km	Km	Adet	Fiziki	Maddi	Bitti	% 70 den Fazla	Dev.Ed.	İHL. Aşm.	Başlanmadı	Açıklamalar		
170.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Çiçeklidere içmesuyu borusu alımı	Çiçeklidere	301		1										100	94	1					Osmaniye valiliğinin 15.11.2006 tarih ve 617 sayılı oluru doğrultusunda
171.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Esenli köyü	Esenli köyü Gazeller Mah.	287		1										100	75	1					Osmaniye valiliğinin 15.11.2006 tarih ve 616 sayılı oluru doğrultusunda
172.	Osmaniye	Sumbas	İçmesuları	Gaffarlı - Akdam - Merkez	Gaffarlı - Akdam - Merkez	618		1										100	100	1					
173.	Osmaniye	T.Kale	İçmesuları	Büyük Tüysüz	Merkez	914		1	33.337									100	70	1					
174.	Osmaniye	T.Kale	İçmesuları	Lalegözü	Merkez	683		1	15.000									100	90	1					
175.	Osmaniye	T.Kale	İçmesuları	Aslanpınarı	Merkez	588		1	15.000									100	137	1					
176.	Osmaniye	Merkez	Sul.Toprak	Arslaniye	Arslaniye	187	1		40.000									100	95	1					Hizmete açıldı.
177.	Osmaniye	Düziçi	Sul.Toprak	Yazlamazlı Köyü	Merkez	1373	1		23.000									100	1000	1					
178.	Osmaniye	Düziçi	Kanalizasyon	Akçakoyunlu	Akçakoyunlu	428	1		124.000									100	100	1					
179.	Osmaniye	Düziçi	Kanalizasyon	Akçakoyunlu köyü	Akçakoyunlu	428			21.000									100	100	1					
180.	Osmaniye	Kadirli	Kanalizasyon	Yoğunluk	Merkez	110	1		7.000									100	100	1					Osmaniye valiliğinin 09.11.2006 tarihli oluru ile

KÖYDES 2007 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

01.01.2007 ENVANTERİNDEKİ DURUMU

KODU ("Y" "DE" veya "EK")	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NİFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	YAKLAŞIK MALİYETİ	TUTARI	ARTAN ÖDENEK (HALE TENZİHLERİN DAN)	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							SULU		SUYU YETERSİZ	SUSUZ	
			ADİ	YERİ (KÖY/ÜNİTE)							FİZİKİ	MADDİ	BİTİ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL AŞM.	BASLANA MADI	AÇIKLAMALAR	SEBEKELİ	ÇEŞMELİ				
Y	Osmaniye	Merkez	ÇONA	Merkez	929	YENİ	SULU	50.000	50.000		100		1								1			
Y	Osmaniye	Merkez	ÇARDAK	Gödebekirli	181	YENİ	SULU	60.000	60.000		100		1								1			
EK	Osmaniye	Merkez	KIRIKLI	Merkez	503	TES.GELŞ.	SULU	14.160	14.160		100		1								1			
Y	Osmaniye	Bahçe	ARIKLİKAŞ	Mercanlar	30	YENİ	SULU	50.000	40.000		100	92	1								1			
Y	Osmaniye	Bahçe	YK.ARICAKLI	Merkez	200	YENİ	SULU	45.000	40.000		100	7	1								1			
EK	Osmaniye	Bahçe	GÖKMUSTAFALI	Merkez	206	TES.GELŞ.	SULU	47.600	47.600		100	74	1								1			
EK	Osmaniye	Bahçe	İNERESİ	Merkez	290	TES.GELŞ.	YETERSİ	27.580	27.580		100	51	1										1	
EK	Osmaniye	Bahçe	AŞ.ARICAKLI	Merkez	300	TES.GELŞ.	YETERSİ	20.000	20.000		100	100	1										1	
EK	Osmaniye	Bahçe	YK.KARDERESİ	Merkez	135	TES.GELŞ.	SULU	17.300	17.300		100	87	1								1			
EK	Osmaniye	Bahçe	YAYLALIK	Merkez	462	TES.GELŞ.	YETERSİ	37.520	37.520		100		1										1	
Y	Osmaniye	Düzüçü	Bayındırı-Gökçayır	Grup İçmesuyu	7215	YENİ	SUSUZ	3.500.000	1.900.000		100	99	1								10		15	3
EK	Osmaniye	Düzüçü	GÜZELYURT	Merkez	183	TES.GELŞ.	SULU		25.105		100	100	1								1			
EK	Osmaniye	Hasanbeyli	KARAYİĞİT	Merkez	664	TES.GELŞ.	SULU	83.000	83.000		100	100	1								1			
EK	Osmaniye	Hasanbeyli	Çolaklı	Merkez	427	TES.GELŞ.	SULU	89.717	62.000		100	100	1								1			
EK	Osmaniye	Hasanbeyli	Kalecik	Merkez	467	TES.GELŞ.	SULU	235.000	43.800		100	100	1								1			
EK	Osmaniye	Hasanbeyli	Karayiğit	Merkez	664	TES.GELŞ.	SULU	30.000	30.000		100	100	1								1			
EK	Osmaniye	Hasanbeyli	Çolaklı	Merkez	427	TES.GELŞ.	SULU	30.000	30.000		100	100	1								1			
Y	Osmaniye	Kadirli	Karapınar İçmesuyu	Grup İçmesuyu	9569	YENİ	SUSUZ	5.000.000	4.634.000- 1.150.000=3.484.000	164000	100	100	1								12		17	34
Y	Osmaniye	Kadirli	Fatma Deresi	Grup İçmesuyu	665	YENİ	SUSUZ	1.500.000	723.000-323.000= 400.000	46.000	100	100	1								4		1	2
Y	Osmaniye	Kadirli	TAHTA	Merkez	376	YENİ	SULU	150.000	160.000		100	100	1								1			
Y	Osmaniye	Kadirli	TAHTA	Taraklık	376	YENİ	SUSUZ	150.000	155.000+50.000= 205.000		100	100	1											1
EK	Osmaniye	Kadirli	EVREN PINARI İÇMESUYU	Grup İçmesuyu	1222	YENİ	SUSUZ	1.500.000	323.000		100	100	1								2		2	6
EK	Osmaniye	Kadirli	YUSUF İZZETTİN İÇME SUYU	Grup İçmesuyu	3509	YENİ	SULU	550.000	445.000	24900	100	100	1								17			

EK	Osmaniye	Kadirli	ORUÇBEY KÖYÜ	Merkez	356	TES.GELŞ.	SUSUZ	241.000	241.000		100	100	1									1	
EK	Osmaniye	Kadirli	KAYASUYU KÖYÜ	Zeynepi mah.	106	TES.GELŞ.	YETERSİ	164.000	129.803	34197	100	100	1									1	
EK	Osmaniye	Kadirli	Bahadırı - Bekereci	Bahadırı - Bekereci	680	TES.GELŞ.	SULU	15.109	15.109		100	100	1									1	
EK	Osmaniye	Kadirli	Değirmendere Köyü	Değirmendere - Kale içmesuyu 1. kısım	48	YENİ	YETERSİ	15.000	15.000		100	100	1									1	
EK	Osmaniye	Kadirli	Karapınar Gurup içmesuyu	İsale hattı geçişi köprü genişletme	9569	ONARIM	SULU	72.676	72.676		100	100	1									1	
Y	Osmaniye	Sumbas	GAFARLI	Ana İsale hattı	1575	TES.GELŞ.	SUSUZ	300.000	250.000	37.600,00	100	85	1									5	
Y	Osmaniye	Sumbas	YEŞİLYAYLA	Merkez	436	YENİ	SULU	25.000	25.000		100	85	1									1	Yeterli içmesuyuna ulaşılmadı.
EK	Osmaniye	Sumbas	Armağanlı	Merkez	262	ONARIM	SULU	25.000	24.965,26		100	100	1									1	
EK	Osmaniye	Sumbas	YEŞİLYAYLA	Geyikçalı	219	ONARIM	YETERSİ	4.519,40	4.519,40		100	100	1									1	
EK	Osmaniye	Sumbas	YEŞİLYAYLA	Merkez 1.Etap	1264	YENİ	YETERSİ	60.000,00			100	87	1									1	
EK	Osmaniye	T.KALE	SAYHÖYÜK	MERKEZ	433	TES.GELŞ.	SULU	24.000,00	23.700,00		100	70	1									1	
AÇIKLAMALAR :																							

KÖYDES 2009 YILI İÇME SUYU İZLEME TABLOSU

KODU "Y" "DE" veya "EK"	İLİ	İLÇESİ	PROJE		NÜFUS	NİTELİĞİ ("YENİ TESİS", "TESİS GELİŞTİRME" veya "BAKIM ONARIM")	KONUSU ("SULU", "SUYU YETERSİZ" veya "SUSUZ")	YAKLAŞIK MALİYETİ	TUTARI	ARTAN ÖDENEK (HALE TENZİLATL ARINDAN)	GERÇEKLEŞME YÜZDESİ		İŞLERİN DURUMU							01.01.2009 ENVANTERİNDEKİ DURUMU				
			ADI	YERİ (KÖY/ÜNİTE)							FİZİKİ	MADDİ	BİTİ İ	%70 DEN FAZLA	DEV. ED.	İHL. AŞM.	BAŞLANA MADI	AÇIKLAMALAR	SULU		SUYU YETERSİZ	SUSUZ		
																			ŞEBEKELİ	ÇEŞMELİ				
Y	Osmaniye	Merkez	Oruçgazi İçmesuyu	Oruçgazi Köyü Merkez	113	TES.GELŞ.	YETERSİ	50.000	20.000		100	100	1								1			
Y	Osmaniye	Merkez	Şekerdere İçmesuyu	Şekerdere/ Akarca Mahallesi	125	TES.GELŞ.	YETERSİ	60.000	20.000		100	100	1								1			
Y	Osmaniye	Merkez	Yarpuz Grup İçmesuyu	Karataş, Dereli, Çona, Çardak,Aslaniye, Nohuttepe, Kumarlı, Issızca,Çağsak,Kayalı, Şekerdere,Tehçi, Devrişiye, Ellek,Yazlamazlı,Selverler	10606	TES.GELŞ.	YETERSİ	220.000	120000+100000		100	100	1						Yarpuz Gurup İçmesuyuna Aktarılan 100000 lira;Merkez- Karataş-Yarpuz Yol Genişletme Projesinden Aktarılan Para Miktarıdır.	28				
Y	Osmaniye	Bahçe	Savranlı 30 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo	Savranlı/ Aygır Mahallesi	30	TES.GELŞ.	YETERSİ	27.207	15.000	3.790	100	75	1								1			
Y	Osmaniye	Bahçe	Arıklıkaş 30 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo	Arıklıkaş/ Taşoluk Mahallesi	137	TES.GELŞ.	YETERSİ	27.207	15.000	3.200	100	79	1								1			
Y	Osmaniye	Bahçe	Yukarıkarderesi 50 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo	Yukarıkarderesi/Yeni Mahalle	92	TES.GELŞ.	YETERSİ	42.655	30.000	6.518	100	78	1									1		
Y	Osmaniye	Bahçe	Örencik 30 Tonluk İçmesuyu Gömme Depo	Örencik/ Kelosmanlar Mahallesi	17	TES.GELŞ.	YETERSİ	27.207	15.000	2.610	100	83	1								1			
EK	Osmaniye	Bahçe	Bekdemir Köyü Bastambaklı Mahallesi İçmesuyu Kaptajı	Bekdemir Köyü/ Bastambaklı Mahallesi	79	TES.GELŞ.	YETERSİ	3.000	3.000		100		1								1			
EK	Osmaniye	Bahçe	Savranlı Köyü Aygır Mahallesi 312 Metre İçmesuyu Borusu	Savranlı/ Aygır Mahallesi	30	ONARIM	YETERSİ	812.94	812.94		100		1								1			
Y	Osmaniye	Düzici	Yazlamazlı İçmesuyu	Yazlamazlı/ Ayşeler Mahallesi	194	TES.GELŞ.	YETERSİ	80.000	70.000									1			1			

Y	Osmaniye	Düziçi	Gümüş İçmesuyu	Gümüş/Mezdağ Mahallesi	399	TES.GELŞ.	YETERSİ	50.000	30.000		100	100	1						Gümüş Köyü -Mezdağ Yaylalık olduğundan Envanter kayıtlarında bulunmamaktadır.			1	
Y	Osmaniye	Hasanbeyli	Çolaklı İçmesuyu	Çolaklı Köyü Merkez	320	TES.GELŞ.	YETERSİ	127.000	50.000	20.000	100	60	1							1			
Y	Osmaniye	Kadirli	Karapınar Gurup İçmesuyu	Söğütlüdere, Kayasuyu, Yenigün, Oruçbey, Mehedinli, Kızıusufllu, Y.Çıyanlı, Sarıtaşımanlı, Göztaş, Kesim, Bahadrlı, Bekereci,Sofular, D.Sofular,Çiğdemli	9464	ONARIM	SULU	355.000	355.000		100	100	1							15			
Y	Osmaniye	Kadirli	Kösepınarı-İlbistanlı (Evren Pınarı Gurup İçmesuyu 2.Kısım)	İlbistanlı-Kocalar-Balller Kösepınarı-Şeritbeleni	978	TES.GELŞ.	YETERSİ	1.900.000	725.000		50	50				1				3		1	1
Y	Osmaniye	Kadirli	Kösepınarı-İlbistanlı (Fatma Deresi Gurup İçmesuyu 2.Kısım)	Kösepınarı, Cilbirtbeleni, Çolaklar, Karabörkler, Nacaklı, Sıyrnıgaç, Şeritbeleni	592	TES.GELŞ.	YETERSİ	1.200.000	175.000		100	100	1							4			3
Y	Osmaniye	Sumbas	Yeşilyayla Köyü İçmesuyu Ana İsale Hattı	Yeşilyayla Köyü Merkez	1266	TES.GELŞ.	YETERSİ	615.000	430.000	476	100	99	1							8			
Y	Osmaniye	Sumbas	Gaffarlı Köyü İçmesuyu	Gaffarlı Köyü /Merkez, Cemiller, Caferler	300	TES.GELŞ.	SUSUZ	214.417	202.000	41664	100	79.4	1							1			2
Y	Osmaniye	Sumbas	Akdam Köyü Davutlar Bağlısı İçmesuyu	Akdam/ Davutlar Mahallesi	137	ONARIM	SULU	56.689	48.000	4305	100	91	1							1			
EK	Osmaniye	Sumbas	Çiçeklidere Köyü Alasirt Mahallesi 2 Adet İçmesuyu Deposu	Çiçeklidere Köyü / Alasirt Mahallesi	230	TES.GELŞ.	YETERSİ	20.054	16.643	3410	100	82	1									1	
EK	Osmaniye	Sumbas	Armağanlı Köyü İçmesuyu 3500 metre İsale Hattı Yenilenmesi	Armağanlı Köyü Merkez	344	ONARIM	SULU	28.893	21.192	7700	100	73	1							1			
Y	Osmaniye	Toprakkale	B.Tüysüz İçmesuyu	B.Tüysüz İçmesuyu Şebekesi	990	TES.GELŞ.	YETERSİ	58.944	60.000	20.588	100	66	1							1			
